Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów

11.02.2016

ID	Nazwa zadania	Start	Finish
1	**2A.1/1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów**	**2015-07-13**	**2017-03-30**
2	**Plan Przesiedleń (RAP)**	**2015-07-13**	**2017-03-30**
3	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	2015-07-13	2016-07-21
4	Badanie socjoekonomiczne z opracowaniem studium socjoekonomicznego	2015-09-20	2016-08-12
5	Konsultacje z lokalną społecznością i z właścicielami nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia	2015-11-16	2016-08-12
6	Uzyskanie PNRI	2016-12-30	2016-12-30
7	Wyceny nieruchomości gruntowych	2016-11-23	2016-12-30
8	Przygotowanie RAP	2015-07-15	2016-08-17
9	Przekazanie RAP w wersji draft do Zamawiającego	2016-08-17	2016-08-17
10	Aktualizacje, korekty	2016-08-17	2016-08-31
11	Uzyskanie "OK" Banku Światowego	2016-08-31	2016-09-08
12	Publiczna dyskusja nad projektem PPNiP	2016-09-23	2016-10-18
13	Przygotowanie PPNiP uwzględniającego wnioski z dyskusji publicznej	2016-10-18	2016-11-18
14	Uzyskanie NO Banku Światowego	2016-11-18	2016-12-02
15	Negocjacje z PAP dotyczące wysokości odszkodowania	2016-12-30	2017-02-28
16	Przekazanie sprawy do Wojewody (w przypadku fiaska negocjacji)	2017-02-28	2017-02-28
17	Wydanie decyzji przez Wojewodę w sprawie wysokości odszkodowań	2017-02-28	2017-03-30
18	Fizyczne wydanie nieruchomości Inwestorowi przez PAP	2017-01-06	2017-03-09
19	Wypłaty odszkodowań	2017-01-06	2017-03-30

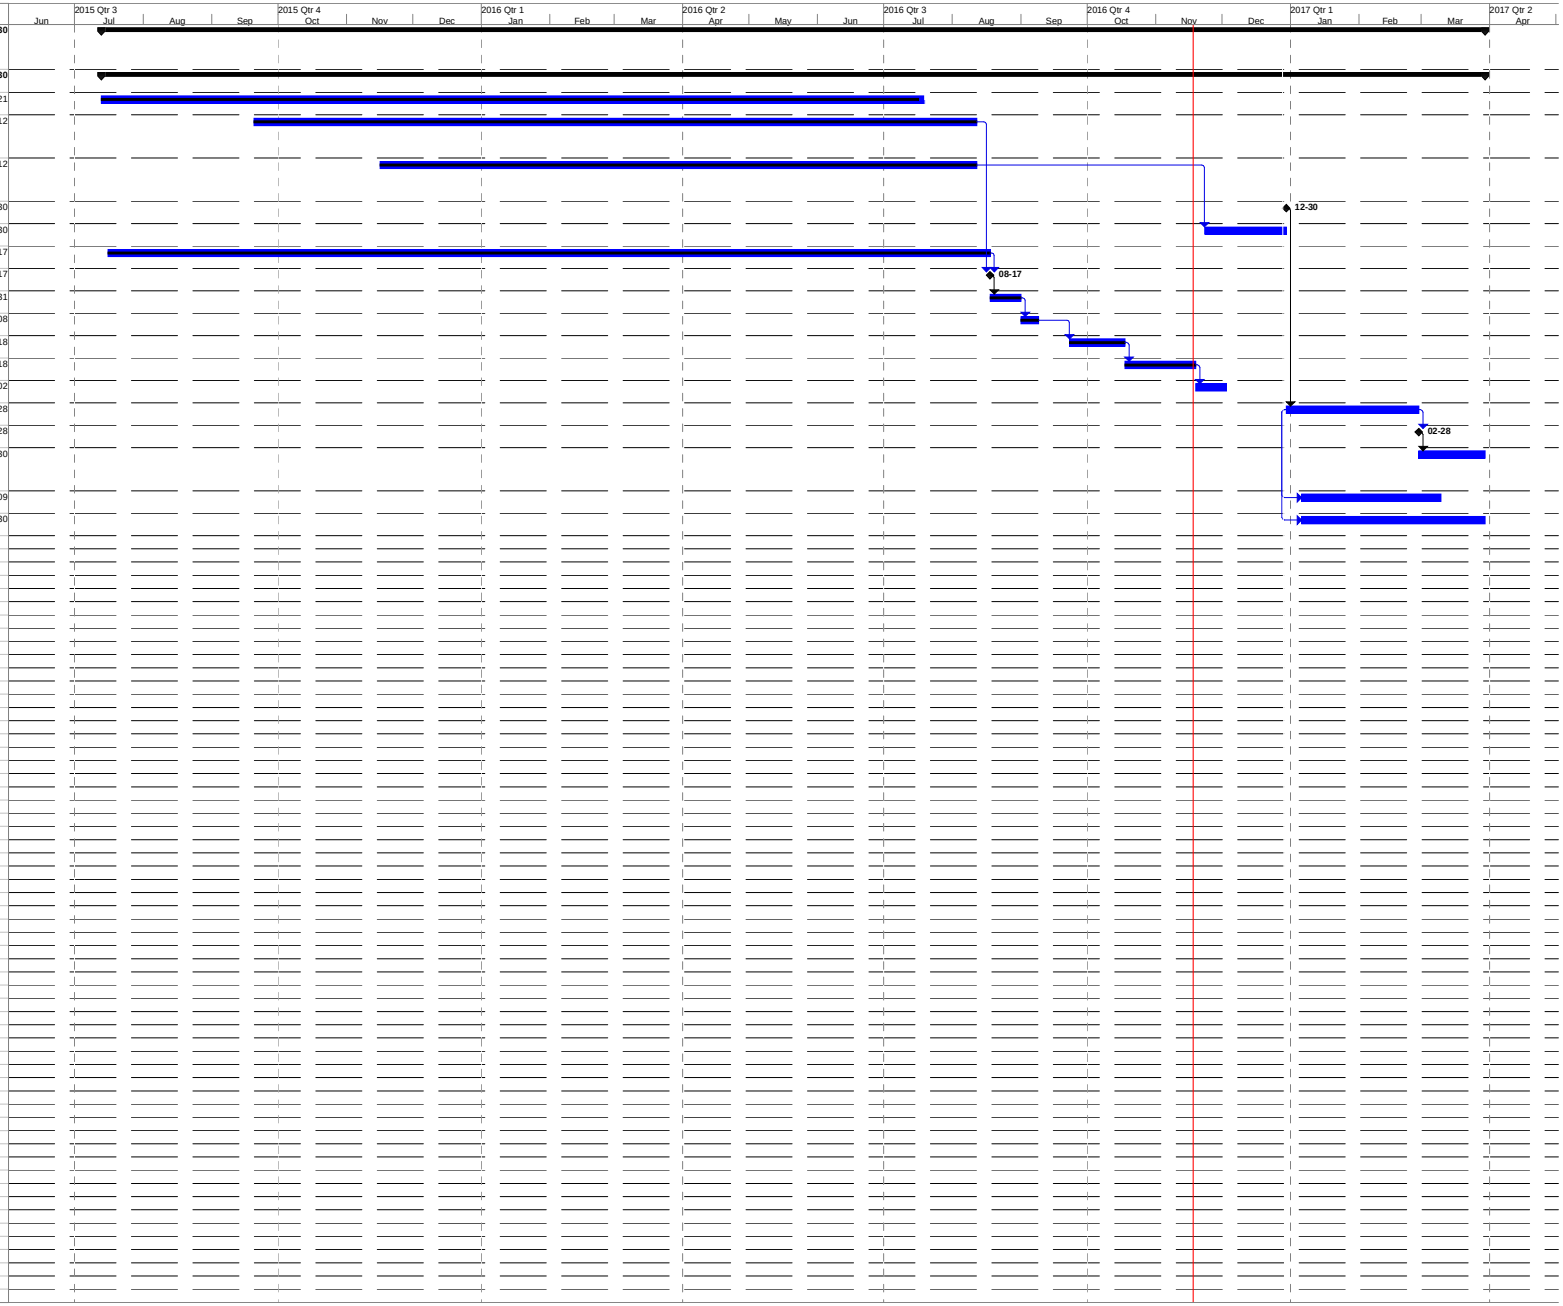

Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Nysa Kłodzka w miejscowości Boboszów

ID	Nazwa zadania	Start	Finish		2015 Qtr 3			2015 Qtr 4			2016 Qtr 1			2016 Qtr 2			2016 Qtr 3			2016 Qtr 4			2017 Qtr 1			2017 Qtr 2	
				Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
